
DECISION N° : **139.06.2024**

OBJET : **Consultation n°2023.01 relative aux travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny**

Lot 01 : Aménagements extérieurs

Avenant n°1

Le MAIRE D'OSNY,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2122-22,

VU le Code de la commande publique, notamment les articles L.2123-1, R.2123-1 1° relatifs aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ouverte,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant délégation d'une partie de ses attributions au Maire conformément à l'article L 2122-22 du C.G.C.T,

VU la décision n°114.05.2023 du 25/05/2023 relative à l'attribution du marché n°2023.01 pour les travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny – lot 01 : Aménagements extérieurs, désignant titulaire la société COCHERY ILE DE FRANCE chemin du Parc à Pierrelaye (95480), représentée par Monsieur Nicolas VAN PARYS pour un montant global et forfaitaire de 1 462 493,07 € HT,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux modificatifs et de réajuster le montant du marché n°2023.01 relatif aux travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny – lot 01 : Aménagements extérieurs,

Considérant que ces travaux non prévus au marché initial sont liés à des sujétions imprévues et qu'ils engendrent une plus-value,

Considérant qu'il convient de passer un avenant n°1 intégrant ces plus-values et que celui-ci ne bouleverse pas l'économie générale du marché, ni n'en change l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause,

Considérant le projet d'avenant 1 ci-annexé,

DECIDE :

Article 1 :

DE SIGNER l'avenant n° 1 relatif au marché n° 2023.01 pour les travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny – lot 01 : Aménagements extérieurs, avec société COCHERY ILE DE FRANCE chemin du Parc à Pierrelaye (95480), représentée par Monsieur Nicolas VAN PARYS.

Le montant de l'avenant n° 1 représente une plus-value de 32 783,28 € HT portant le montant initial du marché de 1 462 493,07 € HT à 1 495 276,35 € HT, soit une augmentation de 2,24 %.

Article 2 :

PRECISE que toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 3 :


Dit que la dépense résultant dudit contrat sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2024.

Article 4 :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en cas d'acte individuel, ou de sa publicité, et de sa transmission au Représentant de l'Etat.

Fait à OSNY, le

12 JUN 2024



Le Maire,

Jean-Michel LEVESQUE



AVENANT N°1
AU
MARCHE n° 2023.01

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements
sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny**

Lot 01 : Aménagements extérieurs

notifié le 25/05/2023

ENTRE

D'une part,

Mairie d'Osny - Château de Grouchy - 14 rue William Thornley – BP 90014 – 95520 Osny
Représentée par Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire

ET

D'autre part, l'entreprise mandataire du marché objet du présent avenant :

Société COCHERY ILE-DE-France – Chemin du Parc – 95480 Pierrelaye
Représentée par Monsieur Nicolas VAN PARYS

Article 1 - Caractéristiques du marché initial :

La consultation pour les travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny a été lancée le 24 janvier 2023.

La consultation est composée de 5 lots.

Qu'au terme de l'analyse, le marché relatif aux travaux d'aménagement extérieurs (lot 01) a été attribué à l'entreprise COCHERY ILE-DE-FRANCE.

Le marché a été notifié à l'entreprise COCHERY ILE-DE-FRANCE, le 25/05/2023, il a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 1 462 493,07 € HT

L'ordre de service n°01 mentionne le démarrage de la période de préparation de chantier à compter du 01/06/2023, avec une date d'achèvement des travaux portée au 31/05/2024.

Article 2 - Objet de l'avenant n° 1

L'avenant 1 prend en compte les travaux modificatifs suivants :

Objet des travaux en plus ou moins-value	N° OS et FTM	N° Devis	Montant HT de la prestation
Adaptation du parcours Pumtrack	OS n°03- FTM 01		0 €
Adaptation de la zone paddock	OS n°04 – FTM 2		0 €
Sol sous préau stabilisé	OS n°05 – FTM 5		6 057,30 €
Suppression du tarif jaune / ajout du tarif bleu	OS n°06 – FTM 6		- 374,50 €
Modification du mobilier	OS n° 07 – FTM 8		- 1 698,80 €
Zone d'infiltration – création d'une noue	OS n°08 – FTM 10		13 032,00 €
Fourniture et pose de bordures type P1 + Prolongement voirie pompier	OS n°09 – FTM 14		4 129,14 €
Raccordement eau potable depuis compteur		Devis 5 du 8/12/2023	1 502,00 €
Mise en place d'un fourreau PTT en tranchée pour raccordement internet du bâtiment		Devis 6 du 15/12/2023	1 941,84 €

Création regard de visite et raccordement des eaux pluviales du bâtiment vestiaires		Devis 15 du 11/04/2024	732,30 €
Modification des garde-corps sur rampe BMX	Annule et remplace OS 10	Devis 17 du 24/05/2024	7 462,00 €
Montant des modifications HT			32 783,28 €
Montant des modifications TTC			39 339,94 €
% d'augmentation de l'avenant n°1			2.24 %
GLOBAL avec plus et moins-values HT			1 495 276,35 €
GLOBAL avec plus et moins-values TTC			1 794 331,62 €

Les FTM et devis correspondants sont joints au présent avenant.

Article 3 - Impact financier

Le montant des travaux supplémentaires de l'avenant n°1 représente une plus-value de 32 783,28 € HT, portant le montant initial du marché de 1 462 493,07 € HT à 1 495 276,35 € HT, soit une augmentation de 2.24 %.

Article 4 – Effet du présent avenant n°1

Toutes les autres dispositions du marché initial demeurent inchangées tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Nicolas VAN PARYS
COCHERY Ile-de-France
Titulaire du marché

31/05/2024

COCHERY ILE DE FRANCE
Chemin du Parc - 95480 PIERRELAYE
Tél : 01.34.18.39.22 - Fax : 01.34.18.39.22
Email : pierrelaye@eurovia.com
SIRET : 17 976 263 00018 - APE 4211 Z

31 MAI 2024



Ville d'Osny

LE MAIRE

JM. LEVESQUE

1957/10/11

1957/10/11

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°01 Emise par: Osrose Le: 22/08/23
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSEE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01	

A - DEMANDE DE MODIFICATION

Demandeur : Maître d'Oeuvre Date de la demande : 22/08/2023

Description sommaire de la demande :

Adaptation du parcours pumptrack

Origine de la demande :		Incidence prévisionnelle de la modification :	
Travaux modificatifs	OUI NON	Lots concernés :	LOT 01
Modification de programme	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		OUI NON
Amélioration de prestations	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Incidence sur les coûts	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aléas imprévisibles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Incidence sur les délais	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Travaux supplémentaires (T S)		Incidence de reprise d'étude ME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Mise au point d'exécution	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Incidence de reprise d'étude titulaire	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Autres	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

Incidences financières réelles de la modification : Pas d'incidence financière

N° Prix marché entreprise(1)	Date modif.	Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché)	Montant H.T accepté	Désignation des ouvrages
			0,00	
TOTAUX		0,00 €	- €	

B- AVIS ET DECISION

<p>Avis de la maîtrise d'œuvre Le 22/08/2023</p> <p style="text-align: right;"><u>Cachet et signature</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorable</p> <p><input type="checkbox"/> Défavorable</p>	<p>Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le <u>12/10/2023</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Cachet et signature</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Accord</p> <p><input type="checkbox"/> Refus</p> <p><small>Note: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise.</small></p>
--	--

C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION

ORDRE DE SERVICE N° 3

Il est demandé à l'entreprise **COCHERY** de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.

- La date de démarrage de travaux est fixée au 01/08/2023
- La délai d'exécution des ouvrages est fixé au 01/06/2024

Pour exécution - €

Établi en 3... exemplaire(s), à le, en 2 copies à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise


<p>Le Maître d'Œuvre :</p> <p>Nom: <u>Victor MUSSARD</u></p> <p>Date: <u>22/08/2023</u></p> <p>Cachet et signature :</p>	<p>Maître d'ouvrage :</p> <p>Nom: <u>MAIRIE DE JEAN-MICHEL LEVESQUE</u></p> <p>Date: <u>12/10/2023</u></p> <p>Cachet et signature :</p>	<p>L'Entreprise :</p> <p>Nom: <u>LIS JARNICK</u></p> <p>Date: <u>05/09/2023</u></p> <p>Cachet et signature :</p>
---	--	---

COCHERY ILE DE FRANCE
 Chemin du Parc - 95480 PIERRELAYE
 Tél. : 01.34.18.39.26 - Fax : 01.34.18.39.22
 Email: pierrelaye@cochery.com
 SIRET : 417 976 252 00 18 - APE 4211 Z

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°01 Emise par: Osmose Le: 22/08/23
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLEMENT D'INFORMATION	

Explication du contexte

Protracks sous-traitant de l'entreprise Cochery mandataire du lot 1, propose une amélioration du tracé pumtrack sans incidence financière. Après une étude approfondie des tracés, le MOE et MOA valide la proposition de Protracks. Le tracé sera également conforme au programme par rapport à la tranche d'âge des utilisateurs.

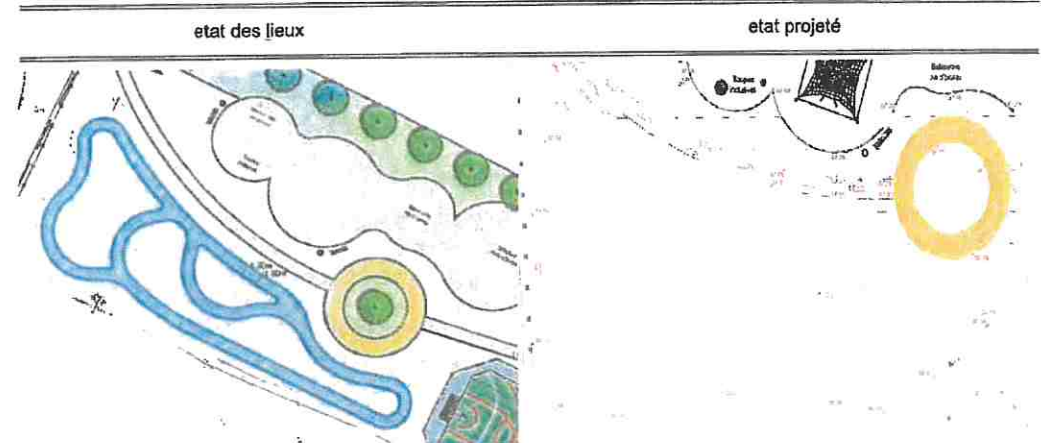

Marché

Pas de poste de prévu

Avis MOE

Favorable

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°02 Emise par: Osmose Le: 22/08/23
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01	

A - DEMANDE DE MODIFICATION

Demandeur : Date de la demande :

Description sommaire de la demande :

Adaptation de la zone paddock

Origine de la demande :		Incidence prévisionnelle de la modification :	
Travaux modificatifs	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Lots concernés :	<input type="text" value="LOT 01"/>
Modification de programme	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Amélioration de prestations	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	Incidence sur les coûts	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X
Aléas imprévisibles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X	Incidence sur les délais	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X
Travaux supplémentaires (T S)		Incidence de reprise d'étude ME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X
Mise au point d'exécution	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X	Incidence de reprise d'étude titulaire	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>
Autres	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X		

Incidences financières réelles de la modification : Pas d'incidence financière

N° Prix marché entreprise(1)	Date modif.	Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché)	Montant H.T accepté	Désignation des ouvrages
			0,00	
TOTAUX		0,00 €	- €	

(1) Devis joint ci-après

B- AVIS ET DECISION

<p>Avis de la maîtrise d'oeuvre Le 22/08/2023</p> <p>Cachet et signature</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorable</p> <p><input type="checkbox"/> Défavorable</p> 	<p>Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le 12/10/23</p> <p>Cachet et signature</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Accord</p> <p><input type="checkbox"/> Refus</p>  <p><small>Nota: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise.</small></p>
---	---

C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION

ORDRE DE SERVICE N°

Il est demandé à l'entreprise **COCHERY** de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.

- La date de démarrage de travaux est fixée au 01/06/2023
- La délai d'exécution des ouvrages est fixé au 01/06/2024


Pour exécution

Etabli en 3... exemplaire(s), à le Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise

<p>Le Maître d'Oeuvre :</p> <p>Nom: Victor MUSSARD Date: 22/08/2023</p> <p>Cachet et signature :</p> 	<p>Le Maître d'Ouvrage :</p> <p>Nom: JEAN-PIERRE BESQUE Date: 12 OCT. 2023</p> <p>Cachet et signature :</p> 	<p>L'Entreprise :</p> <p>Nom: LIS JARMICKI Date: 05/09/2023</p> <p>Cachet et signature :</p> 
---	--	---




COCHERY ILE DE FRANCE
Chemin du Parc - 95480 PIERRELAYE
Tél : 01.34.18.39.26 - Fax : 01.34.18.39.22
Email : pierrelaye@eurovia.com
SIRET : 417 976 263 00018 - APE 4211 Z

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°02 Emise par: Osmose Le: 22/08/23
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01	
D - COMPLEMENT D'INFORMATION		

Explication du contexte

Lors du terrassement et défrichage de la zone paddock, l'entreprise Cochery mandataire du lot 01 a découvert des arbres conservables. Après validation du MOE et MOA le tracé du paddock a suivi des modifications qui ne change pas le programme de départ.

etat des lieux	etat projeté
----------------	--------------

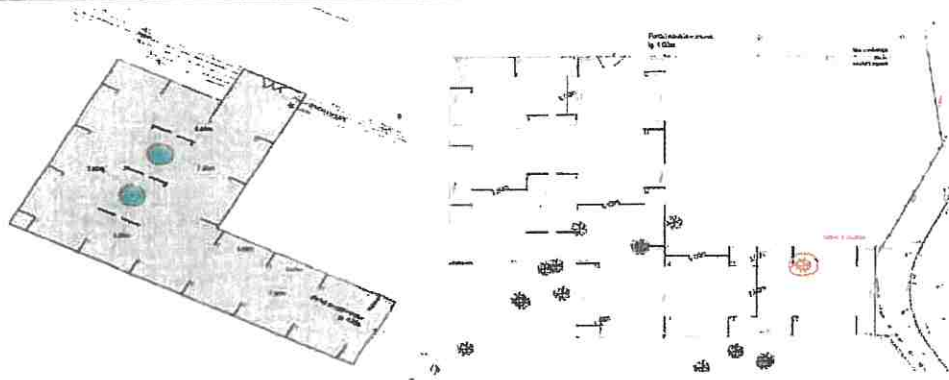

Marché

Pas de poste de prévu

Avis MOE

Favorable

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°05 Émis par: Bancelhon architectes Le: 20/11/2023
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01	

A - DEMANDE DE MODIFICATION

Demandeur : Maître d'Oeuvre Date de la demande : 20/11/2023

Description sommaire de la demande :
Suite à une erreur dans le DCE, le sol du préau n'a pas été prévu. Il est envisagé de le réaliser en stabilisé par l'entreprise du lot 01 - COCHERY.



Origine de la demande :		Incidence prévisionnelle de la modification :	
Travaux modificatifs	OUI NON	Lots concernés : <u>LOT 01</u>	
Modification de programme	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Amélioration de prestations	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Incidence sur les coûts <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Aléas imprévisibles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Incidence sur les délais <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Travaux supplémentaires (T S)		Incidence de reprise d'étude ME <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Mise au point d'exécution	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Incidence de reprise d'étude titulaire <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Autres	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

Incidences financières réelles de la modification :

Position dans la DPGF	Référence	Montant H.T	Montant TTC	Désignation des ouvrages
Détail sur le devis joint		6 057,30	7 268,76 €	Préparation et mise en œuvre de stabilisé sous le préau - 90m2
TOTAUX		6 057,30 €	7 268,76 €	

(1) Devis joint ci-après

B- AVIS ET DECISION

Avis de la maîtrise d'œuvre Le 20/11/2023 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable		Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus Note: la réalisation affective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise.	
--	---	---	---

C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION

ORDRE DE SERVICE N° 5

Il est demandé aux entreprises **COCHERY** de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.

- L'ordre est donné à l'entreprise d'effectuer ces travaux supplémentaires dans l'enchaînement des tâches prévues au planning suivant OS n°2.
- Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1
- Le délai d'exécution des travaux supplémentaires est inclus dans les 25 jours des travaux initiaux, conformément aux délais du planning.
- La date de démarrage des travaux supplémentaires est fixée au mardi 5/12/2023, conformément au planning transmis.

Pour exécution 7 268,76 €

Établi en 3 exemplaire(s), à Paris le 20/11/2023 Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise

Le Maître d'Œuvre : Nom: Philippe BANCELHON Date: 20/11/2023 Cachet et signature 	Le Maître d'Ouvrage : Nom: LEVESQUE Jean-Pierre Date: Cachet et signature: 	L'Entreprise : Nom: LISSARNICKI Anboine Date: 15/12/2023 Cachet et signature: 
---	---	---

COCHERY ILE DE FRANCE
 Chemin du Parc - 95480 PIERRELAYE
 Tél. : 01.34.18.39.26 - Fax : 01.34.18.39.22
 Email : pierrelaye@eurovia.com
 SIRET : 417 976 263 00010 - APE 4211 Z

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°05 Emise par: Bancillon architectes Le: 26/11/2023
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLÉMENT D'INFORMATION	

Explication du contexte

Le groupement de MOE a omis les travaux de sol du préau lors de la répartition entre les lots 01 et 02.
 Il est désormais nécessaire de trancher concernant le choix du revêtement.

état des lieux

Pas de modification

état projeté

Pas de modification

Marché

Avis MOE

Le MOE recommande cette solution peu coûteuse. La mise en place de stabilisé permettra de conserver une unité avec les abords réalisés dans les mêmes matériaux. Le stabilisé n'aura cependant pas de mise à distance entre les abords et l'intérieur du bâtiment en passant sur une dalle qui fera seuil ou entre deux.



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc
95480 PIERRELAYE
F/ +33 1 34 18 39 01
pierrelaye@cochery-iledefrance.fr
ISO 9001

PIERRELAYE le 24 octobre 2023

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 2 - Stabilisé bâtiment
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Préparation et mise en oeuvre de stabilisé sous le préau du bâtiment : 90 m2

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
 Devis 2 - Stabilisé bâtiment

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 2				
6.3.2 Terrassement, transport et mise en œuvre des déblais sur zone; compactage par couches successives dans la butte des virages 1 et 3	m3	33,000	60,20	1 986,60
6.3.4 Réglage, nivellement et compactage du fond de forme	m ²	90,000	0,55	49,50
6.3.6 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile 180g/m ²	m ²	90,000	1,58	142,20
6.3.7 Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en Grave Non traitée 0/63 - sur 0.30m	m ²	90,000	20,10	1 809,00
6.3.8 Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en Grave Non traitée 0/31.5 - sur 0.15m	m ²	90,000	10,10	909,00
6.3.9 Fourniture et mise en œuvre d'un sable stabilisé filérisé sur 0.07m	m ²	90,000	12,90	1 161,00



PIERRELAYE le 24 octobre 2023

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 2 - Stabilisé bâtiment

Devise : Euro

Devis 2

Total H.T.	6 057,30
T.V.A 20,00%	1 211,46
Montant T.T.C. en Euro	7 268,76

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°06 Emiss par: Bancilhon architectes le 18/12/2023
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01	

A - DEMANDE DE MODIFICATION

Demandeur : Maître d'Ouvrage Date de la demande : 07/12/2023

Description sommaire de la demande :
Création d'un nouveau tarif bleu sur le site en lieu et place de la création du tarif jaune prévu au marché



Origine de la demande :		Incidence prévisionnelle de la modification :	
Travaux modificatifs	OUI NON	Lots concernés :	LOT 01
Modification de programme	X		OUI NON
Amélioration de prestations		Incidence sur les coûts	X
Aléas imprévisibles		Incidence sur les délais	X
Travaux supplémentaires (T S)		Incidence de reprise d'étude ME	X
Mise au point d'exécution	X	Incidence de reprise d'étude litulaire	X
Autres			X

Incidences financières réelles de la modification :

Position dans la DPGF	Référence	Montant H.T	Montant TTC	Désignation des ouvrages
Voir devis en pièce-jointe	08/12/2023	-374,50	-449,40	Création d'un nouveau tarif bleu sur le site en lieu et place de la création du tarif jaune prévu au marché
TOTAUX		-374,50 €	- 449,40 €	

(1) Devis joint ci-après

B - AVIS ET DECISION

Avis de la maîtrise d'œuvre Le 18/12/2023 Cachet et signature  <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable	Décision de la Maîtrise d'œuvre (à compléter) Le 02/01/24 à Cachet et signature  <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus Note: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise.
---	--

C - SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION

ORDRE DE SERVICE N° 6

Il est demandé à l'entreprise **COCHERY** de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.

- L'ordre est donné à l'entreprise d'effectuer ces travaux supplémentaires dans l'enchaînement des tâches prévues au planning suivant OS n°2.
- Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1.
- La date de démarrage des travaux supplémentaires est fixé au 1 mars 2024

Pour exécution 449,40 €

Etabli en 3 exemplaire(s), à Paris le 18/12/2023 Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise

Le Maître d'Œuvre : Nom: Philippe BANCILHON Date: 18/12/2023 Cachet et signature 	Le Maître d'Ouvrage : Nom: JEAN MICHEL LEUESQUE Date: 02/01/2024 Cachet et signature 	L'Entreprise : Nom: LESTARNICKI Date: 02/02/24 Cachet et signature 
---	---	---

COCHERY ILE DE FRANCE
 Chemin du Parc - 95480 PIERRELAYE
 Tél. : 01.34.18.39.26 - Fax : 01.34.18.39.22
 Email : pierrelaye@eurovia.com
 SIRET : 417 976 263 00018 - APE 4211 Z

	PIÈCE DE TRAVAIL MODIFICATIVE	Fiche n°06 Emise par Bancillon architectes le 18/12/2023
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLÉMENT D'INFORMATION	

Explication du contexte

Le marché du MOE prévoit l'installation d'un tarif jaune sur le site du projet. La MOA a exposé le refus de réaliser une tranchée sur la voirie de chaussée Jules César. L'installation d'un tarif jaune est donc impossible. La présente fiche technique modificative propose de remplacer l'installation du tarif jaune prévu au marché par l'installation d'un tarif bleu complémentaire sur le site pour le branchement de l'éclairage sportif de la piste de bmx. L'éclairage de la zone foot-bouliste sera branché sur le tarif bleu existant au niveau du bâtiment bouliste

etat des lieux

Pas de modification

etat projeté

Pas de modification

Marché

Avis MOE

Le MOE recommande cette solution qui permettra également une économie dans le marché.



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 08 décembre 2023

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 4 - plus et moins electricité
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Suppression tarif jaune et mise en place tarif bleu

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 4 - plus et moins electricité

Devise : Euro

Désignation des ouvrages		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 4					
8.1.4	Fourniture et pose câble d'alimentation générale 75 KVA	ml	-15,000	17,20	-258,00
8.1.5	Fourniture pose d'armoire tarif jaune	U	-1,000	5 404,00	-5 404,00
PN12	Fourniture pose et raccordement d'un câble d'alimentation générale 36 KVA	ML	5,000	19,50	97,50
PN13	Fourniture et pose en limite de propriété d'un coffret CIBE A4D4 pour un branchement tarif bleu (zone BMX)	U	1,000	450,00	450,00
PN14	Fourniture et pose d'une armoire d'éclairage (zone foot-bouliste) Armoire IP44IK10 posée sur socle béton Commande intégrée dans un compartiment extérieur dédié intégrant les protections des éclairages, du bungalow bouliste, des contacteurs et de l'horloge astronomique	U	1,000	3 990,00	3 990,00
PN15	Reprise de l'alimentation bungalow bouliste sur l'armoire d'éclairage comprenant câblerie depuis le tableau existant vers l'armoire extérieure	FT	1,000	750,00	750,00



PIERRELAYE le 08 décembre 2023

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 4 - plus et moins electricité

Devise : Euro

Devis 4

Total H.T.	-374,50
T.V.A 20,00%	-74,90
Montant T.T.C. en Euro	-449,40

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°08 Emise par: Osmose Lot: 23/02/24
	REHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01	
D - COMPLEMENT D'INFORMATION		

Explication du contexte

Le Maître d'Ouvrage demande une modification des mobiliers urbains prévu dans le cadre du marché

etat des lieux	etat projeté
----------------	--------------

Marché

Poste 7.1 et 7.2 de la DPGF du lot 01

Avis MOE

Favorable



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 27 février 2024

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 11 - Plus et Moins value mobiliers urbain
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny

Lot 01 : Aménagements extérieurs

Plus et moins value mobiliers urbain

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 11 - Plus et Moins value mobiliers urbain

Devise : Euro

Désignation des ouvrages		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 11					
7.2	Fourniture et pose de banc	U	-3,000	680,00	-2 040,00
PN17	Fourniture et pose de banquette large IDYLLE en bois exotique sans lasure pieds en fonte ral 900 sablé long 1.78 m	U	3,000	1 847,40	5 542,20
PN18	Fourniture et pose de corbeille jade sur poteaux	U	3,000	501,34	1 504,02
7.1	Fourniture et pose de corbeille	U	-3,000	2 235,00	-6 705,00



PIERRELAYE le 27 février 2024


DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 11 - Plus et Moins value mobiliers urbain

Devise : Euro

Devis 11

Total H.T.	-1 698,78
T.V.A 20,00%	-339,76
Montant T.T.C. en Euro	-2 038,54

 BANCLION ARCHITECTES AVP-TECHNIQUE-URBANISME	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°10.2 Emission par: Osmose Lec: 00/03/24		
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01			
A - DEMANDE DE MODIFICATION				
Demandeur : Maitre d'ouvrage	Date de la demande : 07/02/2024			
Description sommaire de la demande :				
Création d'une zone d'infiltration supplémentaire				
Origine de la demande :		Incidence prévisionnelle de la modification :		
Travaux modificatifs	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Lots concernés : LOT 01		
Modification de programme	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Amélioration de prestations	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	Incidence sur les coûts <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>		
Aléas Imprévisibles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X	Incidence sur les détails <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X		
Travaux supplémentaires (T S)		Incidence de reprise d'étude ME <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X		
Mise au point d'exécution	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	Incidence de reprise d'étude titulaire <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>		
Autres	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X			
Incidences financières réelles de la modification : Pas d'incidence financière				
N° Prix marché entreprise(1)	Date modif.	Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché)	Montant H.T accepté	Désignation des ouvrages
Voir devis correspondant en annexe	27/02/2024	13 032,00	13 032,00	Création d'une noue d'infiltration entre le merton et le drain sur le terrain de foot sur 90 ml
TOTAUX		13 032,00	13 032,00	
(1) Devis joint ci-après				
B- AVIS ET DECISION				
Avis de la maîtrise d'œuvre Le 23/02/2024 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable		Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le 20/03/24 à OSM Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus Nota: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage et l'entreprise.		
C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION				
ORDRE DE SERVICE N° 8				
Il est demandé à l'entreprise COCHERY de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.				
- La date de démarrage de travaux est fixée au 01/05/2024.				
Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1 à savoir le 31/05/2024				
Pour exécution		13 032,00		
Établi en 3... exemplaire(s), à le Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise				
Le Maître d'Œuvre : Nom: Victor MUSSARD Date: 05/03/2024 Cachet et signature : O.S.M.O.S.E. Ingénierie Siège : 503 rue du Wattrelos 59520 MARC-LEZ-LILLE Tél : 03 20 34 70 00 Mail : contact@osm.fr Site : www.osm.fr APE 7112Z		Le Maître d'Œuvre : Nom: Jean Michel LEVESQUE Date: 20/03/2024 Cachet et signature :		L'Entreprise : Nom: LISSARVICK COCHERY ILE DE FRANCE Chemin du Parc - 95480 PIERRELAYE Tél. : 01 54 18 39 26 - Fax : 01 34 18 39 22 Email : pierrelaye@eurovia.com SIRET : 417 976 263 00018 - APE 4211 Z

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°10.2 Emis par: Osmos Lp: 06/03/24
	REHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR	
MARCHÉ : 2023.01		
D - COMPLEMENT D'INFORMATION		

Explication du contexte

A la demande du Maître d'ouvrage il a été demandé au lot 1 de chiffrer des solutions pour l'infiltration des eaux sur l'espace en stabilisé conservé de l'ancien terrain de football. La proposition correspond à la Création d'une noue d'infiltration entre le merlon et le drain sur le terrain de foot sur 90 ml

etat des lieux

etat projeté

Marché

PN23 Création d'une noue d'infiltration de profondeur 1m
 comprenant le talutage et l'évacuation des déblais en
 decharge agréé

Avis MOE

Favorable



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 27 février 2024

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 12 - Noue (2)
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Création d'une noue d'infiltration entre le merlon et le drain sur le terrain de foot sur 90 ml

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 12 - Noue (2)

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 12				
PN23 Création d'une noue d'infiltration de profondeur 1m comprenant le talutage et l'évacuation des déblais en decharge agréé	ML	90,000	144,80	13 032,00



PIERRELAYE le 27 février 2024


DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 12 - Noue (2)

Devise : Euro

Devis 12


Total H.T.	13 032,00
T.V.A 20,00%	2 606,40
Montant T.T.C. en Euro	15 638,40

		FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF		Fiche n°14 Émise par: Osmose Le: 26/04/24																					
RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01																									
A - DEMANDE DE MODIFICATION																									
Demandeur : Maître d'ouvrage			Date de la demande : 10/04/2024																						
Description sommaire de la demande :																									
Prolongement de la voie pompier																									
Origine de la demande :			Incidence prévisionnelle de la modification :																						
Travaux modificatifs <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Modification de programme <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X Amélioration de prestations <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Aléas imprévisibles <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X Travaux supplémentaires (T S) Mise au point d'exécution <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X			Lots concernés : LOT 01 <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Incidence sur les coûts <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Incidence sur les délais <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X Incidence de reprise d'étude ME <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X Incidence de reprise d'étude Illulaira <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X																						
Incidences financières réelles de la modification : Pas d'incidence financière																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Prix marché entreprise(1)</th> <th>Date modif.</th> <th>Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché)</th> <th>Montant H.T accepté</th> <th>Désignation des ouvrages</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voir devis correspondant en annexe</td> <td>11/04/2024</td> <td>999,00</td> <td>999,00</td> <td>Fourniture et pose de bordure type P1</td> </tr> <tr> <td>Voir devis correspondant en annexe</td> <td>12/04/2024</td> <td>3 130,14 €</td> <td>3 130,14</td> <td>Prolongement voirie pompier</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAUX</td> <td>4 129,14 €</td> <td>4 129,14 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N° Prix marché entreprise(1)	Date modif.	Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché)	Montant H.T accepté	Désignation des ouvrages	Voir devis correspondant en annexe	11/04/2024	999,00	999,00	Fourniture et pose de bordure type P1	Voir devis correspondant en annexe	12/04/2024	3 130,14 €	3 130,14	Prolongement voirie pompier	TOTAUX		4 129,14 €	4 129,14 €	
N° Prix marché entreprise(1)	Date modif.	Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché)	Montant H.T accepté	Désignation des ouvrages																					
Voir devis correspondant en annexe	11/04/2024	999,00	999,00	Fourniture et pose de bordure type P1																					
Voir devis correspondant en annexe	12/04/2024	3 130,14 €	3 130,14	Prolongement voirie pompier																					
TOTAUX		4 129,14 €	4 129,14 €																						
(1) Devis joint ci-après																									
B- AVIS ET DECISION																									
Avis de la maîtrise d'œuvre Le 26/04/2024 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable			Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le 30/04/2024 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus																						
O.S.M.O.S.E. Ingénierie Siège 580 rue de Valenciennes 59520 MARQUÈRE LILLE Membre de l'Ordre des Ingénieurs de France Siret : 525 975 230 00044 - APE 7112B			Mairie d'Osny Nota: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise.																						
C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION																									
ORDRE DE SERVICE N° 9																									
Il est demandé à l'entreprise COCHERY de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs. - La date de démarrage de travaux est fixée au 01/06/2023 Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1 à savoir le 31/05/2024 Pour exécution 4 129,14 €																									
Établi en 3... exemplaire(s), à le Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise																									
Le Maître d'Œuvre : Nom: Victor MUSSARD Date: 26/04/2024 Cachet et signature: O.S.M.O.S.E. Ingénierie Siège 580 rue de Valenciennes 59520 MARQUÈRE LILLE Membre de l'Ordre des Ingénieurs de France Siret : 525 975 230 00044 - APE 7112B		Le Maître d'Ouvrage : Nom: JEAN MICHEL LEVASSOR Date: 06/05/2024 Cachet et signature:		L'Entreprise : Nom: LISARMICKI Antoine Date: 06/05/24 Cachet et signature:																					
COCHERY ÎLE DE FRANCE Chemin du Parc 95480 PIERRELAYE Tél. : 01.34.18.39.26 - Fax : 01.34.18.39.22 Email : pierrelays@eurovia.com SIRET : 417 976 263 00018 - APE 4211 Z																									

	FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF	Fiche n°14
	RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLEMENT D'INFORMATION	Emise par: Osmose Le: 26/04/24

Explication du contexte

Le Maître d'Ouvrage demande un prolongement de la voie pompier prévu dans le cadre du marché

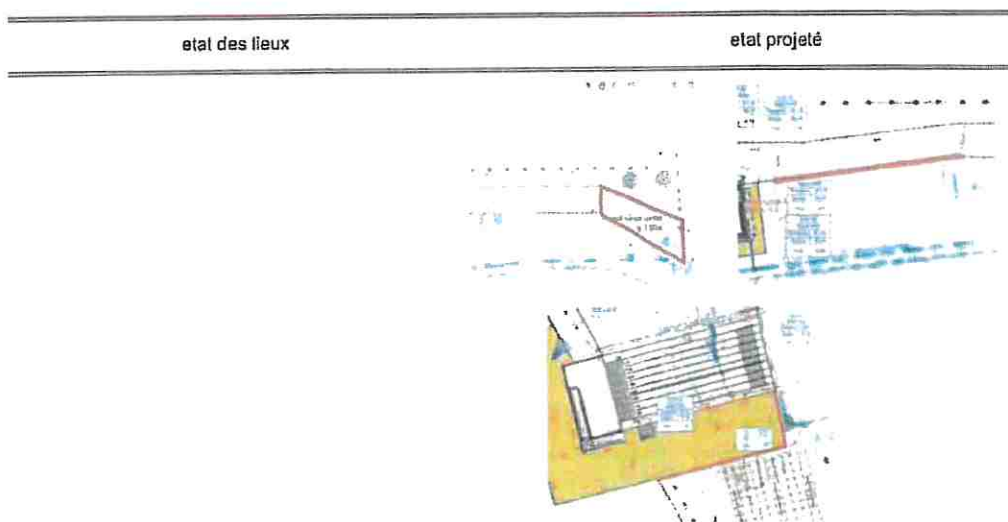

Marché

- 6.3.2 Terrassement, transport et mise en œuvre des déblais sur zone; compactage par couches successives dans la butte des virages 1 et 3
- 6.3.4 Réglage, nivellement et compactage du fond de forme
- 6.3.5 Fourniture et pose de bordure de type P1
- 6.3.6 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile 180g/m²
- 6.3.7 Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en Grave Non traitée 0/63 - sur 0.30m
- 6.3.8 Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en Grave Non traitée 0/31.5 - sur 0.15m

Avis MOE

Favorable



Cochery Ile-de-France Pierrelaye
Chemin du Parc
95480 PIERRELAYE
F/ +33 1 34 18 39 01
pierrelaye@cochery-iledefrance.fr
ISO 9001

PIERRELAYE le 11 avril 2024

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 13 - Bordures P1
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Bordures P1 complémentaires rampe BMX et Derriere bâtiment vestiaire



DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 13 - Bordures P1

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 13				
6.3.5 Fourniture et pose de bordure de type P1	ml	45,000	22,20	999,00



PIERRELAYE le 11 avril 2024

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 13 - Bordures P1

Devise : Euro

Devis 13

Total H.T.	999,00
T.V.A 20,00%	199,80
Montant T.T.C. en Euro	1 198,80



Cochery Ile-de-France Pierrelaye
Chemin du Parc
95480 PIERRELAYE
F/ +33 1 34 18 39 01
pierrelaye@cochery-iledefrance.fr
ISO 9001

PIERRELAYE le 11 avril 2024

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 14 - Prolongement voirie pompier
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs

Prolongement voirie pompier derriere le bâtiment vestiaire pour raccordement au portail du terrain de sport



DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 14 - Prolongement voirie pompier

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 14				
6.3.2 Terrassement, transport et mise en œuvre des déblais sur zone; compactage par couches successives dans la butte des virages 1 et 3	m3	22,000	60,20	1 324,40
6.3.4 Réglage, nivellement et compactage du fond de forme	m ²	38,000	0,55	20,90
6.3.5 Fourniture et pose de bordure de type P1	ml	26,000	22,20	577,20
6.3.6 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile 180g/m ²	m ²	38,000	1,58	60,04
6.3.7 Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en Grave Non traitée 0/63 - sur 0.30m	m ²	38,000	20,10	763,80
6.3.8 Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en Grave Non traitée 0/31.5 - sur 0.15m	m ²	38,000	10,10	383,80



PIERRELAYE le 11 avril 2024

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 14 - Prolongement voirie pompier

Devise : Euro

Devis 14

Total H.T.	3 130,14
T.V.A 20,00%	626,03
Montant T.T.C. en Euro	3 756,17



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 08 décembre 2023

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 5 - Raccordement AEP
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Plus value pour raccordement eau potable depuis le compteur

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 5 - Raccordement AEP

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 5				
5.1.2 Réalisation d'une tranchée	ml	20,000	59,60	1 192,00
5.1.9 Fourniture et pose de canalisation PEHD dia. 40 mm pour Bâtiments	ml	20,000	15,50	310,00



PIERRELAYE le 08 décembre 2023

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 5 - Raccordement AEP

Devise : Euro

Devis 5

Total H.T.	1 502,00
T.V.A 20,00%	300,40
Montant T.T.C. en Euro	1 802,40



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 15 décembre 2023

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 6 - Tranchée internet
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Mise en place d'un fourreaux PTT en tranchée pour raccordement internet du bâtiment (local technique vers la limite de propriété)

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 6 - Tranchée internet

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 6				
5.1.2 Réalisation d'une tranchée	ml	29,000	59,60	1 728,40
5.1.6 Fourniture et pose de fourreaux pour télécom en batteries de trois	ml	29,000	7,36	213,44



PIERRELAYE le 15 décembre 2023

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 6 - Tranchée internet

Devise : Euro

Devis 6

Total H.T.	1 941,84
T.V.A 20,00%	388,37
Montant T.T.C. en Euro	2 330,21



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 11 avril 2024

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 15 - Descente EP
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny
Lot 01 : Aménagements extérieurs**

Création regard de visite et raccordement descente eaux pluviale bâtiment vestiaire

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 15 - Descente EP

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 15				
5.1.20 Reprise descente eau pluviale de la toiture par regard 40X40	U	3,000	244,10	732,30



PIERRELAYE le 11 avril 2024

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 15 - Descente EP

Devise : Euro

Devis 15

Total H.T.	732,30
T.V.A 20,00%	146,46
Montant T.T.C. en Euro	878,76



Cochery Ile-de-France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

F/ +33 1 34 18 39 01

pierrelaye@cochery-iledefrance.fr

ISO 9001

PIERRELAYE le 24 mai 2024

Devis

- > Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 17 - Garde corps rampe
- > Affaire suivie par : Antoine LIS JARNICKI

VILLE D'OSNY

Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny

Lot 01 : Aménagements extérieurs

Modification garde corps rampe BMX

DEVIS

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 17 - Garde corps rampe

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
Devis 17				
9.4 Fourniture et pose de garde de corps ht 1.40m en tête de rampe	ml	-60,000	184,80	-11 088,00
PN26 Fourniture et pose de garde corps BMX h 1.1m sur la rampe Garde corps en tubes 50x50mm, montants verticaux tous les 500 mm, lisse supérieur en tube 50x50mm, poteaux sur platine fixé sur voile béton, remplissage tolé sur une face ral 7016	U	35,000	530,00	18 550,00



PIERRELAYE le 24 mai 2024

DEVIS Récapitulatif

> Notre référence : 0020066419 - OSNY - REHABILITATION PISTE BMX
Devis 17 - Garde corps rampe

Devise : Euro

Devis 17

Total H.T.	7 462,00
T.V.A 20,00%	1 492,40
Montant T.T.C. en Euro	8 954,40

Délais de livraison : 6 semaines

Temps de pose : 1 semaine

